

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Dự án: Đại lý 3S Truck & Bus Hyundai Miền Tây | Mã: V6502

Chủ đầu tư: Thế giới xe tải | Địa điểm: TP. Cần Thơ

MỐC CẬP NHẬT

15/09/2026

Hệ thống QLDA Streamlit
Hyundai Miền Tây

Số liệu trích xuất thời gian thực từ hệ thống. Tiến độ các hạng mục được đối soát theo nhật ký hiện trường mới nhất.

18.8%

TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ


3/16

HẠNG MỤC HOÀN THÀNH

107 ngày

SỐ NGÀY CÒN LẠI (31/12)

1. TIẾN ĐỘ HÌNH ẢNH GANTT (GANTT CHART)

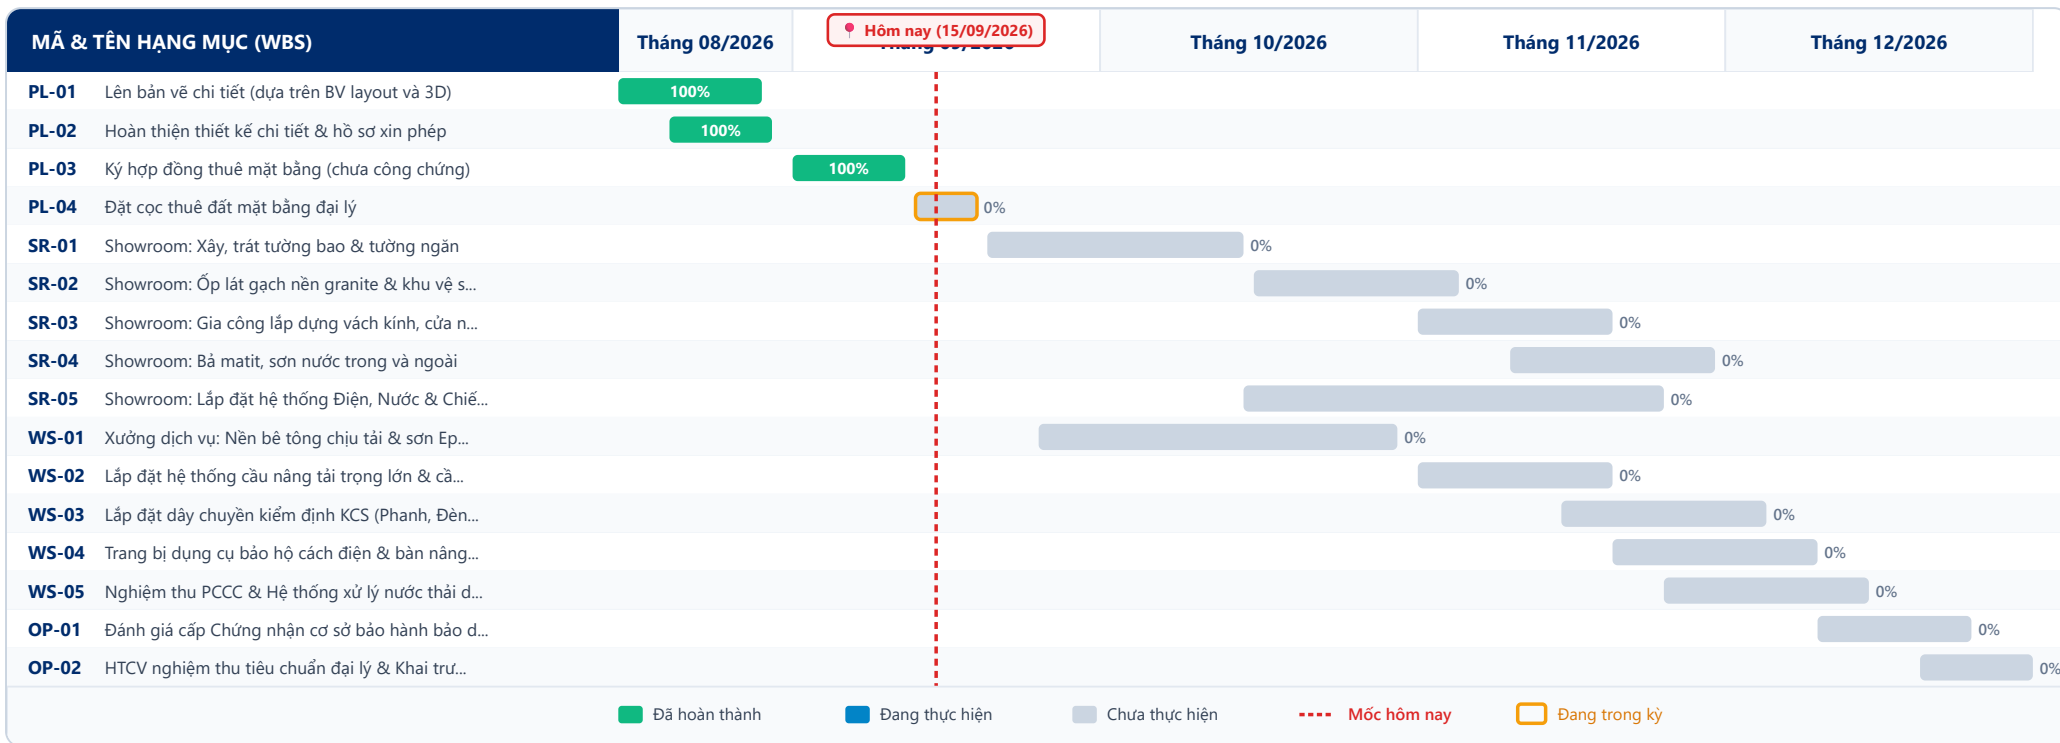

2. DANH MỤC HẠNG MỤC THI CÔNG CHI TIẾT (WBS)

Mã	Tên hạng mục công việc	Phân khu	Thời gian thực hiện	Tiến độ	Trạng thái	Ghi chú thực tế	Phụ trách
PL-01	Lên bản vẽ chi tiết (dựa trên BV layout và 3D)	Thiết kế & Pháp lý	15/08/2026 - 29/08/2026	100%	Đã hoàn thiện		Ban QLDA / TVTK
PL-02	Hoàn thiện thiết kế chi tiết & hồ sơ xin phép	Thiết kế & Pháp lý	20/08/2026 - 30/08/2026	100%	Đã hoàn thiện	HTCV - HXG - Hyundai Miền tây Đã ký bản vẽ chi tiết Đang gửi Đại lý bổ sung giáp lai	Ban QLDA
PL-03	Ký hợp đồng thuê mặt bằng (chưa công chứng)	Mặt bằng & Pháp lý	01/09/2026 - 12/09/2026	100%	Đã hoàn thiện	Đã cập nhật hợp đồng thuê công chứng ngày 12/09/2026 Đã cập nhật giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gần nhất ngày 26/08/2026	Ban Giám Đốc / Pháp chế
PL-04	Đặt cọc thuê đất mặt bằng đại lý	Mặt bằng & Pháp lý	13/09/2026 - 19/09/2026	0%	Chưa thực hiện	Mốc thanh toán cọc 19/09/2026	Ban Tài chính - Kế toán
SR-01	Showroom: Xây, trát tường bao & tường ngăn	Showroom (XDCB)	20/09/2026 - 15/10/2026	0%	Chưa thực hiện	Bắt đầu sau khi cọc đất (20/09/2026)	Nhà thầu xây dựng
SR-02	Showroom: Ốp lát gạch nền granite & khu vệ sinh	Showroom (XDCB)	16/10/2026 - 05/11/2026	0%	Chưa thực hiện		Nhà thầu hoàn thiện
SR-03	Showroom: Gia công lắp dựng vách kính, cửa nhôm	Showroom (XDCB)	01/11/2026 - 20/11/2026	0%	Chưa thực hiện		Nhà thầu nhôm kính
SR-04	Showroom: Bả matit, sơn nước trong và ngoài	Showroom (XDCB)	10/11/2026 - 30/11/2026	0%	Chưa thực hiện		Nhà thầu sơn
SR-05	Showroom: Lắp đặt hệ thống Điện, Nước & Chiếu sáng	Showroom (XDCB)	15/10/2026 - 25/11/2026	0%	Chưa thực hiện		Nhà thầu M&E
WS-01	Xưởng dịch vụ: Nền bê tông chịu tải & sơn Epoxy	Xưởng Dịch vụ 3S	25/09/2026 - 30/10/2026	0%	Chưa thực hiện		Nhà thầu xây dựng
WS-02	Lắp đặt hệ thống cầu nâng tải trọng lớn & cầu cắt kéo	Xưởng Dịch vụ 3S	01/11/2026 - 20/11/2026	0%	Chưa thực hiện		NCC Thiết bị Garage
WS-03	Lắp đặt dây chuyền kiểm định KCS (Phanh, Đèn, Khói/Khí thải)	Thiết bị QCVN 121	15/11/2026 - 05/12/2026	0%	Chưa thực hiện		NCC Thiết bị kiểm định
WS-04	Trang bị dụng cụ bảo hộ cách điện & bàn nâng pin Xe Điện/Hybrid	Trang bị Xe Điện (EV)	20/11/2026 - 10/12/2026	0%	Chưa thực hiện		Bộ phận Kỹ thuật / Dịch vụ
WS-05	Nghiệm thu PCCC & Hệ thống xử lý nước thải dịch vụ	Môi trường & PCCC	25/11/2026 - 15/12/2026	0%	Chưa thực hiện		Cơ quan PCCC / Môi trường
OP-01	Đánh giá cấp Chứng nhận cơ sở bảo hành bảo dưỡng QCVN 121:2024/BGTVT	Kiểm định & Chứng nhận	10/12/2026 - 25/12/2026	0%	Chưa thực hiện		Tổ chức đánh giá sự phù hợp / Cơ quan tiếp nhận
OP-02	HTCV nghiệm thu tiêu chuẩn đại lý & Khai trương hoạt động	Vận hành & Khai trương	20/12/2026 - 31/12/2026	0%	Chưa thực hiện		Ban Giám Đốc & HTCV
