

# BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THI CÔNG & GIÁM SÁT HIỆN TRƯỜNG

Dự án: Đại lý 3S Xe Thương Mại Hyundai Miền Tây | Mã: HMT-CANTHO-2026

Chủ đầu tư: Thế giới xe tải | Địa điểm: TP. Cần Thơ

MỐC CẬP NHẬT

15/09/2026

Hệ thống QLDA Streamlit  
Hyundai Miền Tây

Số liệu trích xuất thời gian thực từ hệ thống. Tiến độ các hạng mục được đối soát theo nhật ký hiện trường mới nhất.

18.8%

TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ


3/16

HẠNG MỤC HOÀN THÀNH

107 ngày

SỐ NGÀY CÒN LẠI (31/12)

## 1. TIẾN ĐỘ HÌNH ẢNH GANTT (GANTT CHART)

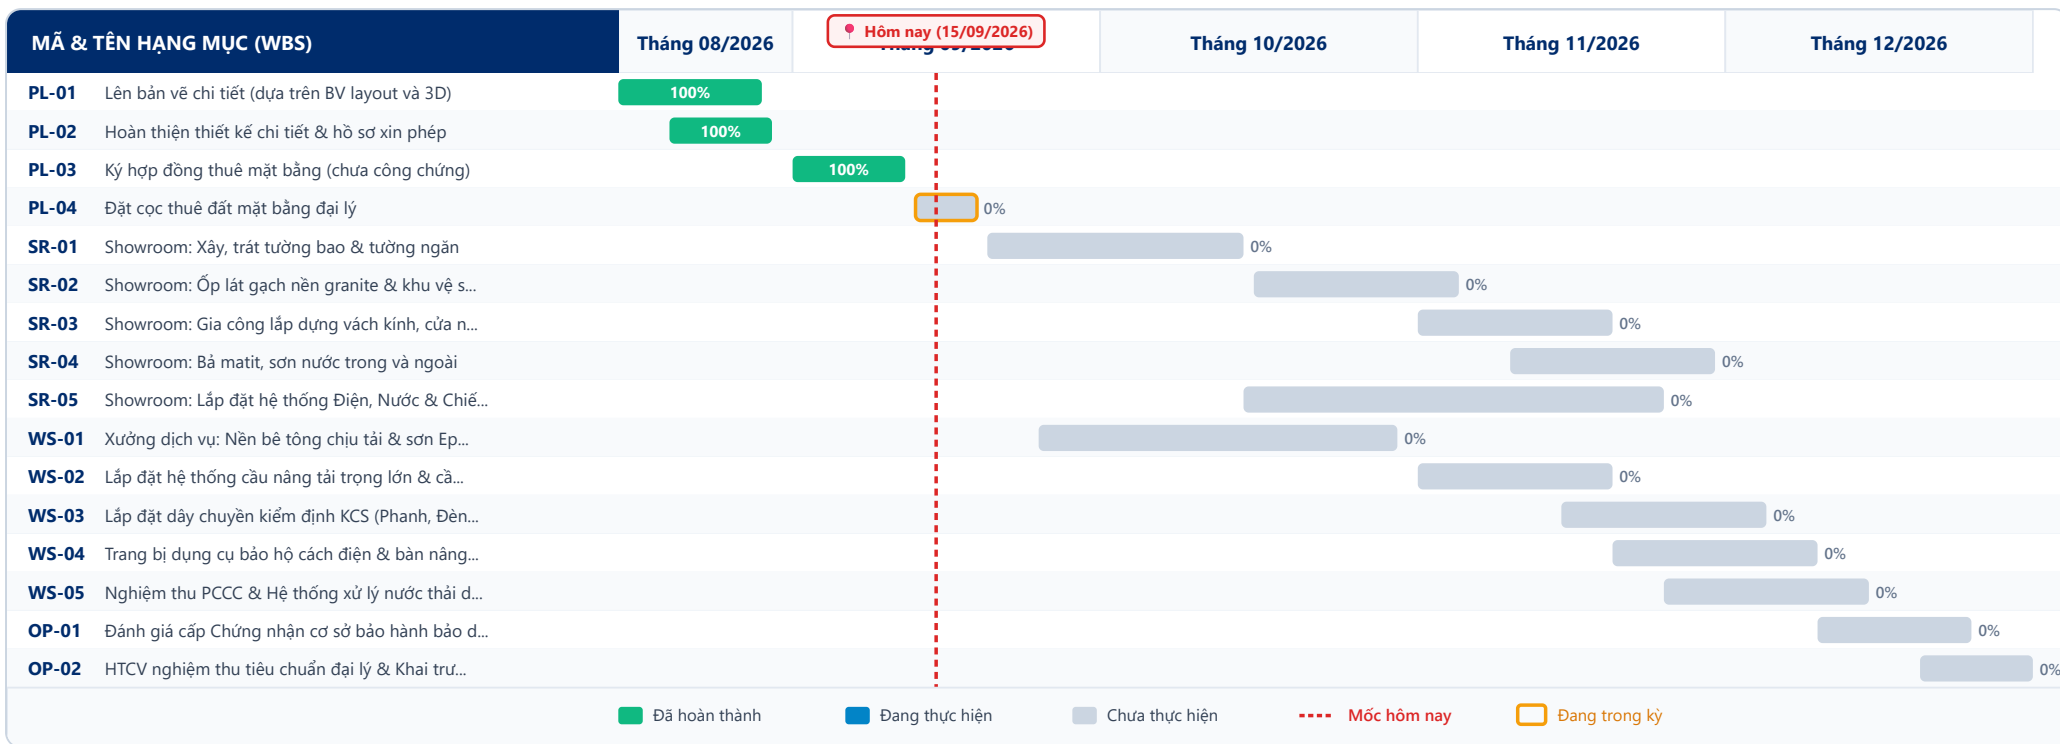

2. DANH MỤC HẠNG MỤC THI CÔNG CHI TIẾT (WBS)

| Mã    | Tên hạng mục công việc                                               | Phân khu               | Thời gian thực hiện     | Tiến độ | Trạng thái     | Ghi chú thực tế                                                                                                                | Phụ trách                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| PL-01 | Lên bản vẽ chi tiết (dựa trên BV layout và 3D)                       | Thiết kế & Pháp lý     | 15/08/2026 - 29/08/2026 | 100%    | Đã hoàn thiện  |                                                                                                                                | Ban QLDA / TVTK                                 |
| PL-02 | Hoàn thiện thiết kế chi tiết & hồ sơ xin phép                        | Thiết kế & Pháp lý     | 20/08/2026 - 30/08/2026 | 100%    | Đã hoàn thiện  | HTCV - HXG - Hyundai Miền tây Đã ký bản vẽ chi tiết<br>Đang gửi Đại lý bổ sung giáp lai                                        | Ban QLDA                                        |
| PL-03 | Ký hợp đồng thuê mặt bằng (chưa công chứng)                          | Mặt bằng & Pháp lý     | 01/09/2026 - 12/09/2026 | 100%    | Đã hoàn thiện  | Đã cập nhật hợp đồng thuê công chứng ngày 12/09/2026<br>Đã cập nhật giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gần nhất ngày 26/08/2026 | Ban Giám Đốc / Pháp chế                         |
| PL-04 | Đặt cọc thuê đất mặt bằng đại lý                                     | Mặt bằng & Pháp lý     | 13/09/2026 - 19/09/2026 | 0%      | Chưa thực hiện | Mốc thanh toán cọc 19/09/2026                                                                                                  | Ban Tài chính - Kế toán                         |
| SR-01 | Showroom: Xây, trát tường bao & tường ngăn                           | Showroom (XDCB)        | 20/09/2026 - 15/10/2026 | 0%      | Chưa thực hiện | Bắt đầu sau khi cọc đất (20/09/2026)                                                                                           | Nhà thầu xây dựng                               |
| SR-02 | Showroom: Ốp lát gạch nền granite & khu vệ sinh                      | Showroom (XDCB)        | 16/10/2026 - 05/11/2026 | 0%      | Chưa thực hiện |                                                                                                                                | Nhà thầu hoàn thiện                             |
| SR-03 | Showroom: Gia công lắp dựng vách kính, cửa nhôm                      | Showroom (XDCB)        | 01/11/2026 - 20/11/2026 | 0%      | Chưa thực hiện |                                                                                                                                | Nhà thầu nhôm kính                              |
| SR-04 | Showroom: Bả matit, sơn nước trong và ngoài                          | Showroom (XDCB)        | 10/11/2026 - 30/11/2026 | 0%      | Chưa thực hiện |                                                                                                                                | Nhà thầu sơn                                    |
| SR-05 | Showroom: Lắp đặt hệ thống Điện, Nước & Chiếu sáng                   | Showroom (XDCB)        | 15/10/2026 - 25/11/2026 | 0%      | Chưa thực hiện |                                                                                                                                | Nhà thầu M&E                                    |
| WS-01 | Xưởng dịch vụ: Nền bê tông chịu tải & sơn Epoxy                      | Xưởng Dịch vụ 3S       | 25/09/2026 - 30/10/2026 | 0%      | Chưa thực hiện |                                                                                                                                | Nhà thầu xây dựng                               |
| WS-02 | Lắp đặt hệ thống cầu nâng tải trọng lớn & cầu cắt kéo                | Xưởng Dịch vụ 3S       | 01/11/2026 - 20/11/2026 | 0%      | Chưa thực hiện |                                                                                                                                | NCC Thiết bị Garage                             |
| WS-03 | Lắp đặt dây chuyền kiểm định KCS (Phanh, Đèn, Khói/Khí thải)         | Thiết bị QCVN 121      | 15/11/2026 - 05/12/2026 | 0%      | Chưa thực hiện |                                                                                                                                | NCC Thiết bị kiểm định                          |
| WS-04 | Trang bị dụng cụ bảo hộ cách điện & bàn nâng pin Xe Điện/Hybrid      | Trang bị Xe Điện (EV)  | 20/11/2026 - 10/12/2026 | 0%      | Chưa thực hiện |                                                                                                                                | Bộ phận Kỹ thuật / Dịch vụ                      |
| WS-05 | Nghiệm thu PCCC & Hệ thống xử lý nước thải dịch vụ                   | Môi trường & PCCC      | 25/11/2026 - 15/12/2026 | 0%      | Chưa thực hiện |                                                                                                                                | Cơ quan PCCC / Môi trường                       |
| OP-01 | Đánh giá cấp Chứng nhận cơ sở bảo hành bảo dưỡng QCVN 121:2024/BGTVT | Kiểm định & Chứng nhận | 10/12/2026 - 25/12/2026 | 0%      | Chưa thực hiện |                                                                                                                                | Tổ chức đánh giá sự phù hợp / Cơ quan tiếp nhận |
| OP-02 | HTCV nghiệm thu tiêu chuẩn đại lý & Khai trương hoạt động            | Vận hành & Khai trương | 20/12/2026 - 31/12/2026 | 0%      | Chưa thực hiện |                                                                                                                                | Ban Giám Đốc & HTCV                             |
